

Zeitplan Schildgen

Wibke Krause

6-60 Mobilität und Stadtentwicklung

Hintergrund

In Schildgen/Katterbach stehen einige Baumaßnahmen an:


- Straßenplanung/-bau (Deckensanierung, Barrierefreiheit, Förderung Umweltverbund etc.)
 - Abwasserbeseitigungskonzept
- enge Abstimmung der Infrastrukturmaßnahmen erforderlich
- Teilweise zeitliche Überschneidungen



Verkehrserhebung „Am Schild“



**Stadtentwicklung
Strategische
Verkehrsentwicklung
Bergisch Gladbach**

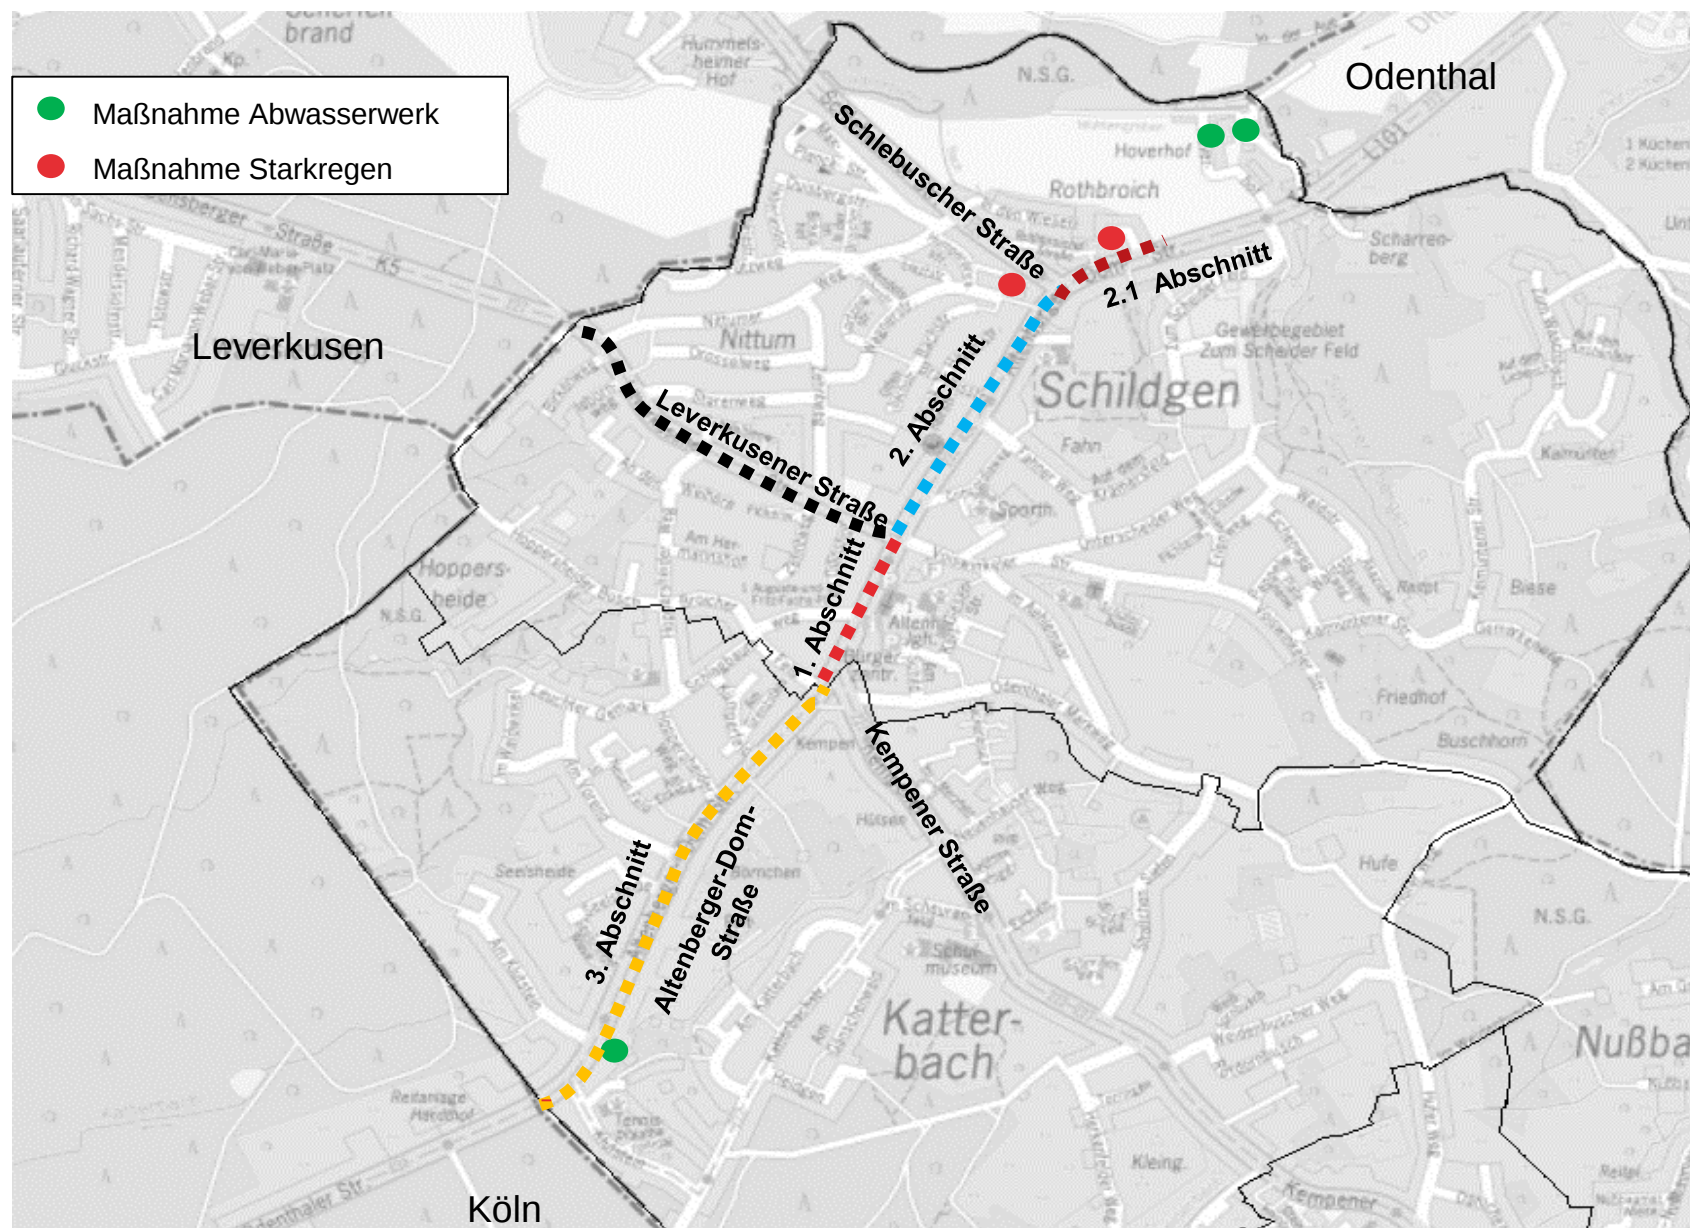

Maßnahmen

1. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

6-60:

- Maßnahmebeschluss Entwurfsplanung für Anfang 2026 beabsichtigt
- Förderantragstellung für Bau ab 2027


7-66:

- bauliche Umsetzung ab 2027

7-68:

- Kamerabefahrung Hauptkanal & Hausanschlüsse Sommer 2024
- Maßnahmenermittlung Ende 2024

- Je nach Zustand der Kanäle und Hausanschlüsse können sich zeitliche Verzögerungen ergeben, da die Schäden zunächst behoben werden müssen, bevor die Straße umgebaut wird

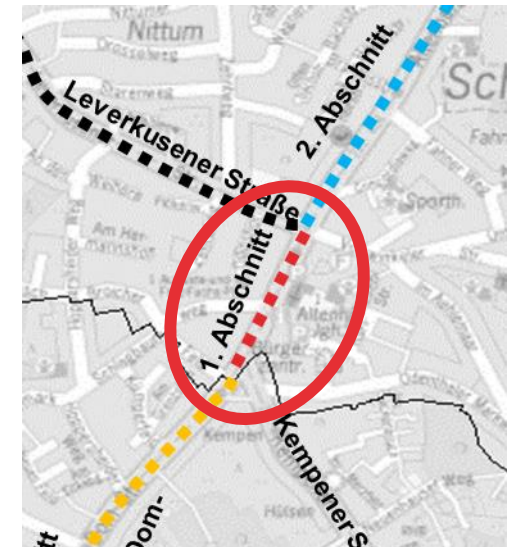

Maßnahmen

2. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

6-60:

- Maßnahmebeschluss August 2023

7-66:

- Umsetzung ab Herbst 2024 möglich (zunächst Genehmigung Haushalt erforderlich), abhängig von Ergebnissen Kamerabefahrung Kanäle

7-68:

- Kamerabefahrung Hauptkanal, Hausanschlüsse sowie Auswertung der Befahrung Jan./Feb. 2024
 - Ableitung mgl. Baunahmen März 2024
- Je nach Zustand der Kanäle und Hausanschlüsse können sich zeitliche Verzögerungen ergeben, da die Schäden zunächst behoben werden müssen, bevor die Straße umgebaut wird



Maßnahmen

2.1 Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

7-66:

- Fahrbahndeckensanierung und Sanierung Gehweg im Jahr 2024 geplant
(zusammen mit Abschnitt 2 Altenberger-Dom-Straße)

7-68:

- 2 Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) geplant
 - 30.14.16 Altenberger-Dom-Straße (A177) 2025
 - 30.14.17 Hoverhof (A178) 2026

- Maßnahmen aus dem ABK müssen zunächst umgesetzt werden, falls die Maßnahme aus dem ABK im Bereich der Fahrbahndeckensanierung sein wird



Maßnahmen

3. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

6-60:

- Planung für Nebenanlagen ab 2024, Maßnahmebeschluss 2025
- Förderantragstellung für Bau ab 2026


7-66:

- Deckensanierung ab 2025 möglich, aber mit Nebenanlagen erst ab 2026

7-68:

- Kamerabefahrung Hauptkanal & Hausanschlüsse Sommer 2024
- Abteilung möglicher Baumaßnahmen Ende 2024
- Zusätzlich große Maßnahme ABK für 2026/2027 geplant

- Maßnahmen aus dem ABK müssen zunächst umgesetzt werden → zeitliche Verzögerung für ggf. Teilabschnitt

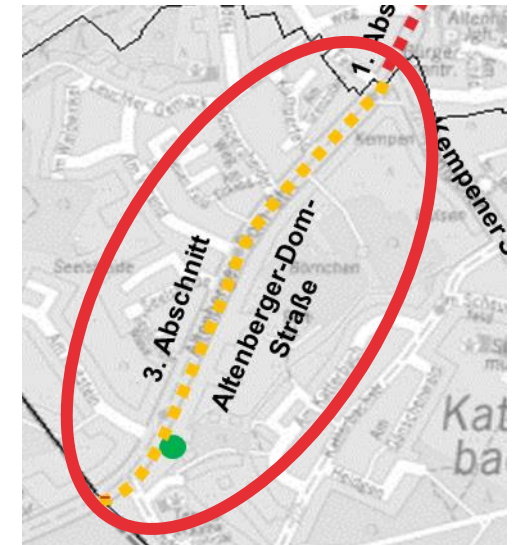

Maßnahmen

Leverkusener Straße

6-60:

- Geplant Vergabe der Planung für die barrierefreien Nebenanlagen Dezember 2023
- Entwurfsplanung Frühjahr 2024, zusätzlich Genehmigung Haushalt erforderlich

7-66:

- Maßnahmebeschluss April 2023 für neue Deckschicht
- Umsetzung in 2024 beabsichtigt, Gelder bereits vorhanden

7-68:

- Maßnahme aus dem ABK für 2032 geplant
- Umsetzung 2024 kann sich durch noch nicht vorhanden Planung für die Barrierefreiheit/Haushaltsgenehmigung noch verzögern
- ggf. Konflikt mit Bau 2. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
