Schulbau GmbH
Bergisch Gladbach

GS21 | Rahmenterminplan

[redacted]
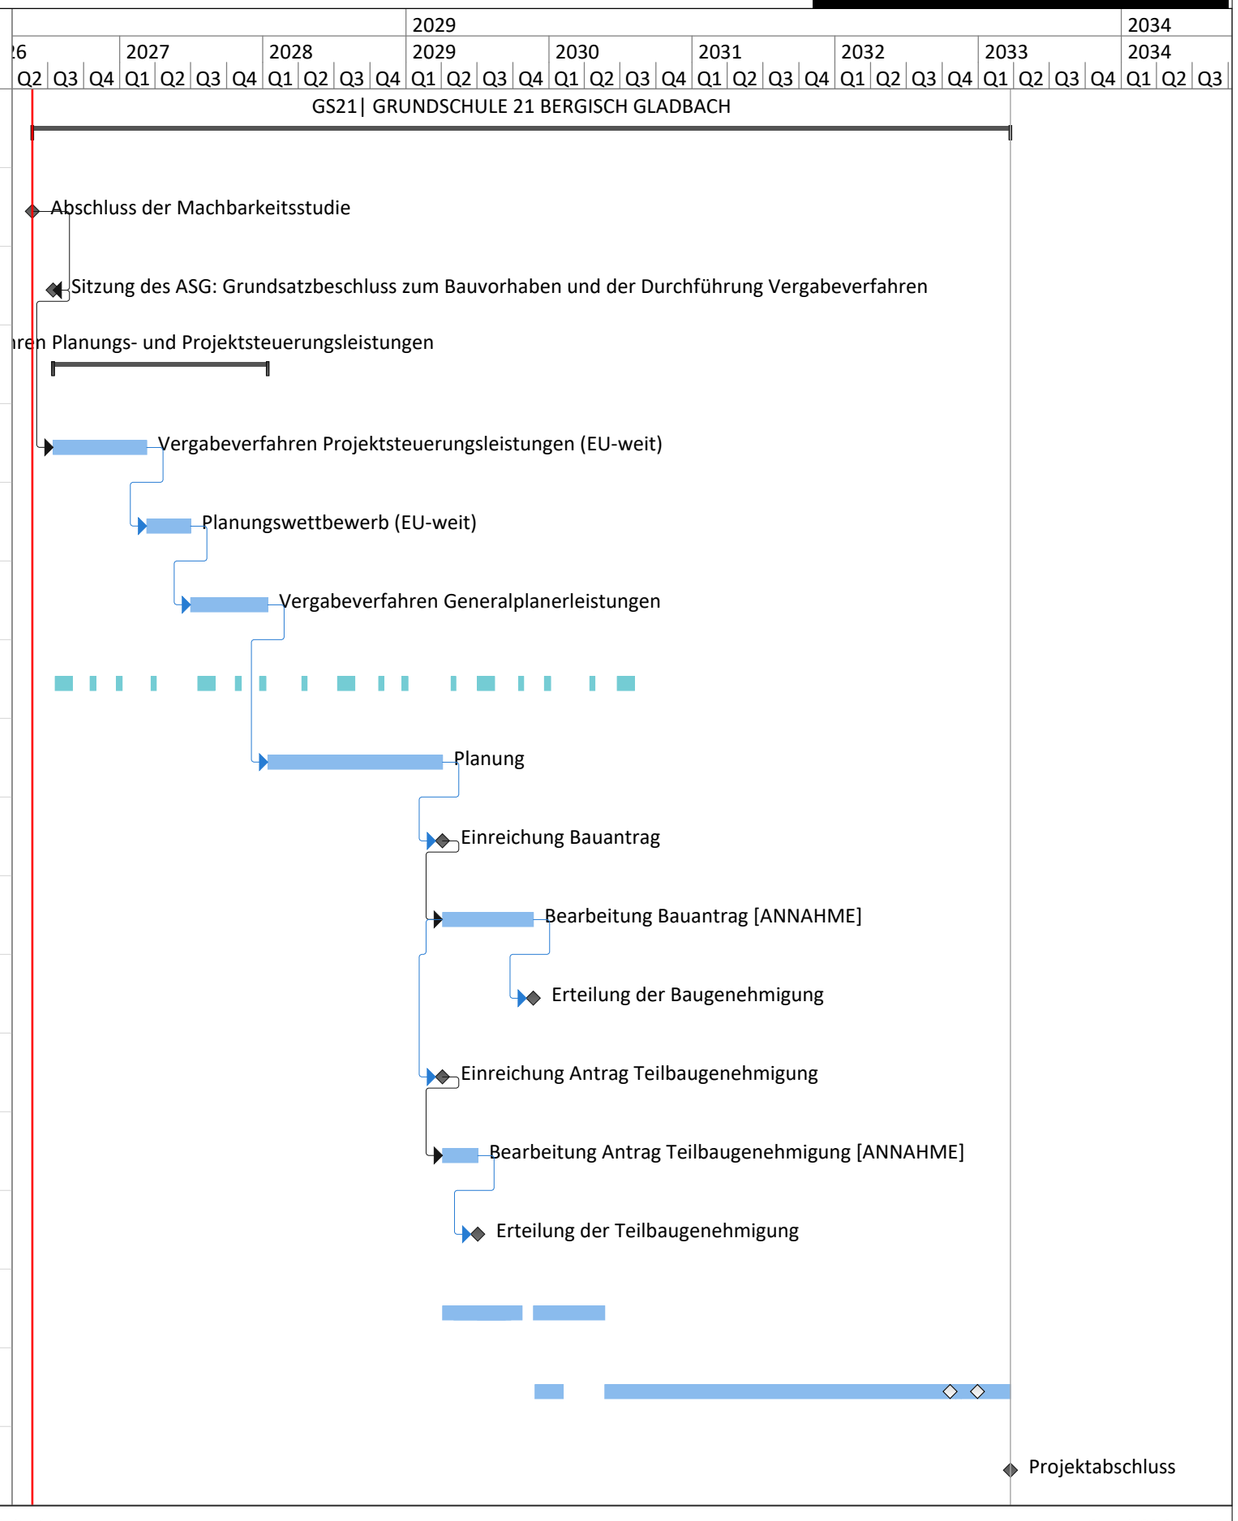
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**GS21| GRUNDSCHULE 21 BERGISCH GLADBACH**	336 Wochen?	22.05.2026	23.03.2033	
2	**Abschluss der Machbarkeitsstudie**	0 Tage	22.05.2026	22.05.2026	
3	**Sitzung des ASG: Grundsatzbeschluss zum Bauvorhaben und der Durchführung Vergabeverfahren**	0 Tage	15.07.2026	15.07.2026	2EE+6 Wochen
4	**Vergabeverfahren Planungs- und Projektsteuerungsleistungen**	72,8 Wochen	15.07.2026	13.01.2028	
5	Vergabeverfahren Projektsteuerungsleistungen (EU-weit)	32 Wochen	15.07.2026	10.03.2027	3
6	Planungswettbewerb (EU-weit)	15 Wochen	11.03.2027	30.06.2027	5
7	Vergabeverfahren Generalplanerleistungen	25,8 Wochen	01.07.2027	13.01.2028	6
8	Ferien gem. Ferienordnung für Nordrhein-Westfalen bis 2029/30	196,6 Wochen?	20.07.2026	06.08.2030	
26	**Planung**	59,2 Wochen	14.01.2028	03.04.2029	7
27	Einreichung Bauantrag	0 Tage	03.04.2029	03.04.2029	26
28	Bearbeitung Bauantrag [ANNAHME]	8 Monate	04.04.2029	21.11.2029	27
29	Erteilung der Baugenehmigung	0 Tage	21.11.2029	21.11.2029	28
30	Einreichung Antrag Teilbaugenehmigung	0 Tage	04.04.2029	04.04.2029	28AA
31	Bearbeitung Antrag Teilbaugenehmigung [ANNAHME]	3 Monate	04.04.2029	02.07.2029	30
32	Erteilung der Teilbaugenehmigung	0 Tage	02.07.2029	02.07.2029	31
33	**Ausführungsvorbereitung/ Ausschreibung und Vergabe**	55 Wochen	04.04.2029	22.05.2030	27
39	**Bauausführung**	164,6 Wochen	26.11.2029	23.03.2033	
49	**Projektabschluss**	**0 Tage**	**23.03.2033**	**23.03.2033**	**48**
