



Am Stadion/Buchholzstrasse

# Gewerbegebiet West

Juli 14 bis Dez. 14


Mai 14 bis Juni 14

Okt. 13 bis April 14

Okt 13 bis April 14

Okt. 13 bis April 15

# Gronau

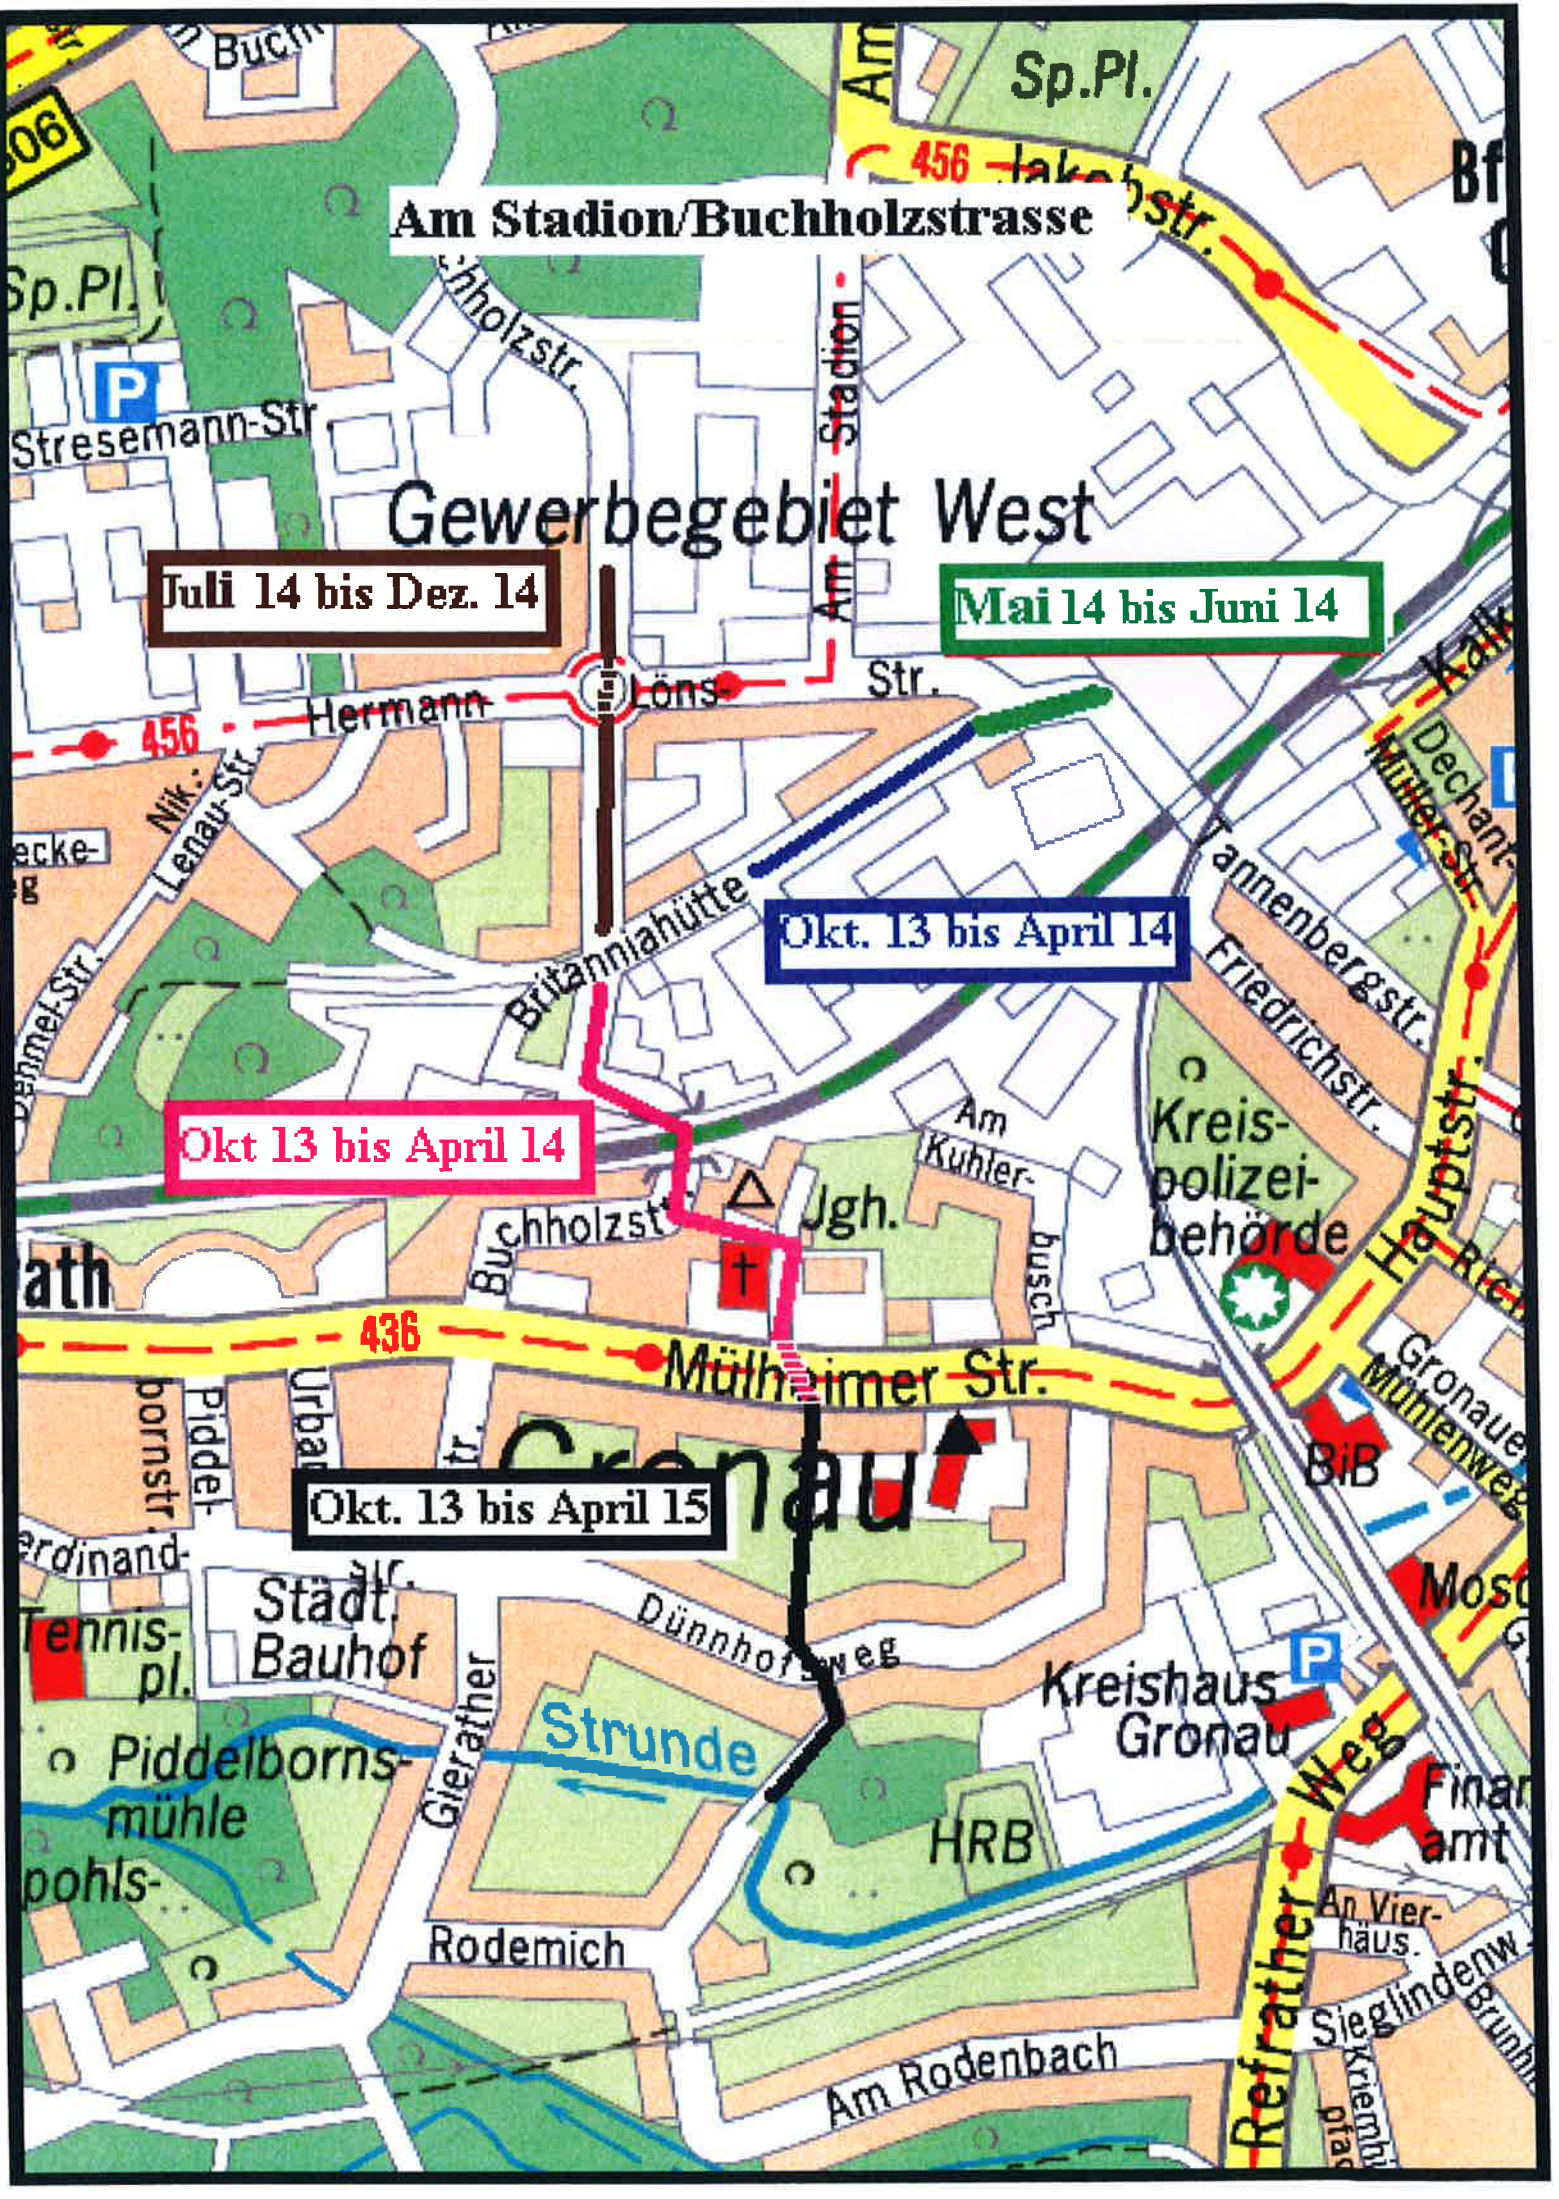

— HW-Profil Strunde, Abschnitt Buchmühle

— HW-Profil Strunde, Abschnitt süd. Hauptstr. bis Metsä Board, Los 2, inkl. RKB/RW-Kanal

**Hinweis 1:** Für die hier dargestellten Maßnahmen, die sowohl von der Stadt als auch vom Strundeverband durchgeführt werden, wird ein einheitliches Verkehrslenkungskonzept erarbeitet, dass in den politischen Gremien vorgestellt wird!

Eine Darstellung der Details ist in diesem Rahmen nicht möglich!

Regenklärbecken (RKB)  
04.2014-03.2015

Umbindung Hebborner Bach inkl. Durchlass Strunde  
04.2014-12.2014

Hochwasserprofil Strunde  
04.2016-11.2016

Verkehrslenkung dauerhaft zweispurig

Trennbauwerk 2013

Regenwasserkanal (Ableitung zum RKB) inkl. Trennbauwerk  
04.2014-03.2015  
zusammen mit RKB

Aufbau prov. Kreisverkehr zur Verkehrslenkung  
04.2014-05.2014  
mögl. Rückbau 02.2016-03.2016

HW-Profil  
04.2014-03.2016

**Hinweis 2:** Der Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen zum Hochwasserschutz ist abhängig vom Eingang des Förderbescheides durch die BR Köln (derzeitige Annahme: Mai 2013). Sowohl die Umbindung des Hebborner Baches als auch der Bau des RKB und des RW-Kanals in der Schnabelmühle sind ebenfalls von dieser Vorgabe abhängig. Verzögerungen beim Eingang des Förderbescheides führen zwangsläufig zu Verzögerungen aller hier dargestellten Maßnahmen!

BA 1: RKB Am Eichenkamp inkl. Kanalbau  
7 Monate  
Feb. 14 – Aug. 14

BA 2: Kanalbau Am Eichenkamp  
2 Monate  
Aug. 14 - Sept. 14

BA 3: Kanalbau Ackerstraße  
6,5 Monate  
Sept. 14 - März 15

BA 4: Kanalbau in der Auen  
(von Ackerstraße bis Hausnr. 39)  
2 Monate  
März 15 - April 15

BA 5: Kanalbau in der Auen  
(von Hausnr. 39 bis 17)  
2,5 Monate  
Mai 15 - Juli 15

BA 6: Kanalbau in der Auen  
(von Hausnr. 17 bis 1)  
2 Monate  
Juli 15 - Aug. 15

BA 7: Kanalbau in der Auen (von Einlektungsstelle A61  
bis Ackerstraße), inkl. Trennbauwerk  
2 Monate  
Aug. 15 - Sept. 15

**Hydr. Sanierung  
In der Auen  
Ackerstraße  
Am Eichenkamp**

